

# การดำเนินการประสานการปรับปรุง/ก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้างของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2560



ยุทธศาสตร์ที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

6. พัฒนาพื้นที่ของ  
มหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่ง  
ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มี  
คุณภาพและเป็นแหล่ง  
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
ของท้องถิ่น



ประมวลภาพการ  
ปรับปรุง/ ก่อสร้าง  
สิ่งก่อสร้างของมหาวิทยาลัย

**รายงานการประสานดำเนินการปรับปรุง/ก่อสร้างสิ่งก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัย  
ปีงบประมาณ 2560**

สถานที่	รายการปรับปรุง/ก่อสร้าง	วงเงินจัดจ้าง	วันเริ่ม/สิ้นสุดสัญญา	วันส่งมอบ/ตรวจรับงาน	หมายเหตุ
ศูนย์เวียงบัว	1. ก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ลานอเนกประสงค์ด้านหน้าอาคาร 90 ปี	8,098,871	เริ่มวันที่ 11 ต.ค. 2559 สิ้นสุดสัญญา 9 ม.ค.2560	วันที่ 10 ก.พ.2560	งบประมาณรายได้
	2. ปรับปรุงต่อเติมด้านหน้าอาคารห้องสมุด	517,000	เริ่มวันที่ 5 ม.ค. 2560 สิ้นสุดสัญญา 4 เม.ย.2560	วันที่ 10 มี.ค.2560	งบประมาณแผ่นดิน (กระตุ้น)
	3. ปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง อาคาร 2	1,280,000	เริ่มวันที่ 22 ก.พ. 2560 สิ้นสุดสัญญา 21 มิ.ย.2560	วันที่ 27 ก.ค.2560	งบประมาณรายได้
	4. ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ของโรงเรียนสาธิต	738,300	เริ่มวันที่ 18 เม.ย.2560 สิ้นสุดสัญญา 16 ก.ค.2560	วันที่ 17 ก.ค.2560	งบประมาณรายได้
	5. ก่อสร้างอาคารโรงอาหาร จำนวน 1 หลัง พร้อมระบบสาธารณูปโภค และภูมิทัศน์โดยรอบ ต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว	16,980,000	เริ่มวันที่ 1 ส.ค.2560 สิ้นสุดสัญญา 16 ก.พ.2561 มีขยายระยะเวลาการก่อสร้าง มี 6 งวด	ระหว่างดำเนินการงวด 2-6	งบประมาณรายได้

สถานที่	รายการปรับปรุง/ก่อสร้าง	วงเงินจัดจ้าง	วันเริ่ม/สิ้นสุดสัญญา	วันส่งมอบ/ตรวจรับงาน	หมายเหตุ
ศูนย์เวียงบัว (ต่อ)	6. ก่อสร้างถนนด้านหน้าอาคารการศึกษาพิเศษเชื่อมต่ออาคาร 90 ปี ราชภัฏ เชียงใหม่	6,009,900	เริ่มวันที่ 8 ก.ย. 2560 สิ้นสุดสัญญา 16 ธ.ค.2560	วันที่ 1 ก.พ.2561	งบประมาณรายได้
	7. จ้างขุดเจาะน้ำบาดาล พร้อมก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาล บริเวณพื้นที่เมืองเชียงใหม่	687,000	เริ่มวันที่ 5 ก.ย. 2560 สิ้นสุดสัญญา 12 ม.ค.2561	วันที่ 22 ม.ค.2561	งบประมาณรายได้
	8. ปรับปรุงอาคารเทพรัตนราชสุดา ชั้น 1 - 4 จำนวน 12 ห้อง เป็นศูนย์การเรียนรู้โปลานศึกษาและศิลปวัฒนธรรมล้านนา	1,280,000	เริ่มวันที่ 22 ก.พ. 2560 สิ้นสุดสัญญา 21 มิ.ย.2560	วันที่ 27 ก.ค.2560	งบประมาณรายได้
	9. ก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุและครุภัณฑ์ของนักศึกษา จำนวน 1 หลัง	644,973	เริ่มวันที่ 20 ธ.ค.2559 สิ้นสุดสัญญา 18 เม.ย.2560	วันที่ 30 มี.ค.2560	งบประมาณรายได้


สถานที่	รายการปรับปรุง/ก่อสร้าง	วงเงินจัดจ้าง	วันเริ่ม/สิ้นสุดสัญญา	วันส่งมอบ/ตรวจรับงาน	หมายเหตุ
ศูนย์แมริม	1. โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	461,000,000	เริ่มวันที่ 3 ส.ค. 2558 สิ้นสุดสัญญา 14 พ.ย. 2561 มี 35 งวด	ระหว่างดำเนินการงวดที่ 23	งบประมาณแผ่นดิน (414,800,000) รายได้สมทบ (46,200,000)
	2. จ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์ พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 กลุ่มอาคาร	313,000,000	เริ่มวันที่ 14 มี.ค. 2559 สิ้นสุดสัญญา 30 ส.ค. 2561 มี 29 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 15	งบประมาณแผ่นดิน (283,104,000) รายได้สมทบ (31,456,000)
	3. จ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารอำนวยการและบริหารกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	294,790,000	เริ่มวันที่ 14 มี.ค. 2559 สิ้นสุดสัญญา 3 ก.ย. 2561 มี 26 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 17	งบประมาณรายได้
	4. จ้างก่อสร้างถนนและภูมิทัศน์กลุ่มอาคารเรียนรวมและกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ศูนย์แมริม	88,500,000	เริ่มวันที่ 1 ส.ค. 2560 สิ้นสุดสัญญา 11 ก.ค. 2561 มี 10 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 4	งบประมาณรายได้
	5. จ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารอเนกประสงค์และอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	120,323,000	เริ่มวันที่ 1 ส.ค. 2560 สิ้นสุดสัญญา 11 ก.ค. 2561 มี 18 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 6	งบประมาณรายได้

สถานที่	รายการปรับปรุง/ก่อสร้าง	วงเงินจัดจ้าง	วันเริ่ม/สิ้นสุดสัญญา	วันส่งมอบ/ตรวจรับงาน	หมายเหตุ
ศูนย์แมริม	6. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต 1 รายการ	2,085,000	เริ่มวันที่ 9 ก.พ. 2560 สิ้นสุดสัญญา 9 พ.ค.2560	วันที่ 19 พ.ค.2560	งบประมาณแผ่นดิน
	7. ปรับปรุงและซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตภายในศูนย์แมริม	6,060,000	เริ่มวันที่ 9 ก.พ. 2560 สิ้นสุดสัญญา 8 มิ.ย.2560	วันที่ 10 มิ.ย.2560	งบประมาณแผ่นดิน
	8. จ้างปรับปรุงอ่างเก็บน้ำธรรมชาติบริเวณอ่างเวียงบัว ศูนย์แมริม	3,599,000	เริ่มวันที่ 21 ก.พ. 2560 สิ้นสุดสัญญา 20 มิ.ย.2560	วันที่ 23 มิ.ย.2560	งบประมาณรายได้
	9. จ้างก่อสร้างรั้วแนวเขตมหาวิทยาลัย ศูนย์แมริม	1,450,000	เริ่มวันที่ 1 ส.ค. 2560 สิ้นสุดสัญญา 11 ก.ค.2560	วันที่ 25 ก.ย.2560	งบประมาณแผ่นดิน (กระตุ้น)
	10. จ้างปรับปรุงอ่างเก็บน้ำธรรมชาติบริเวณเตาถ่าน ศูนย์แมริม	989,000	เริ่มวันที่ 8 พ.ค. 2560 สิ้นสุดสัญญา 4 ก.ย.2560		งบประมาณรายได้
	11. จ้างปรับปรุงระบบสูบน้ำคลองชลประทาน ศูนย์แมริม	3,750,000	เริ่มวันที่ 7 ก.ค. 2560 สิ้นสุดสัญญา 3 ธ.ค.2560	วันที่ 12 ธ.ค.2560	งบประมาณรายได้
	12. ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำบริเวณต้นห้วยห้า ศูนย์แมริม	1,929,000	เริ่มวันที่ 6 ก.ย. 2560 สิ้นสุดสัญญา 2 ก.พ.2561	วันที่ 5 ก.พ.2561	งบประมาณรายได้

สถานที่	รายการปรับปรุง/ก่อสร้าง	วงเงินจัดจ้าง	วันเริ่ม/สิ้นสุดสัญญา	วันส่งมอบ/ตรวจรับงาน	หมายเหตุ
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	1. จ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	245,626,000	เริ่มวันที่ 1 เม.ย.59 สิ้นสุดสัญญา 21 มี.ค.61 มี 19 งวด	ระหว่างดำเนินการงวดที่ 19	งบประมาณแผ่นดิน (221,175,000)  รายได้สมทบ (24,575,000)

ที่มา : งานพัสดุ กองคลัง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

# ศูนย์เวียงบัว

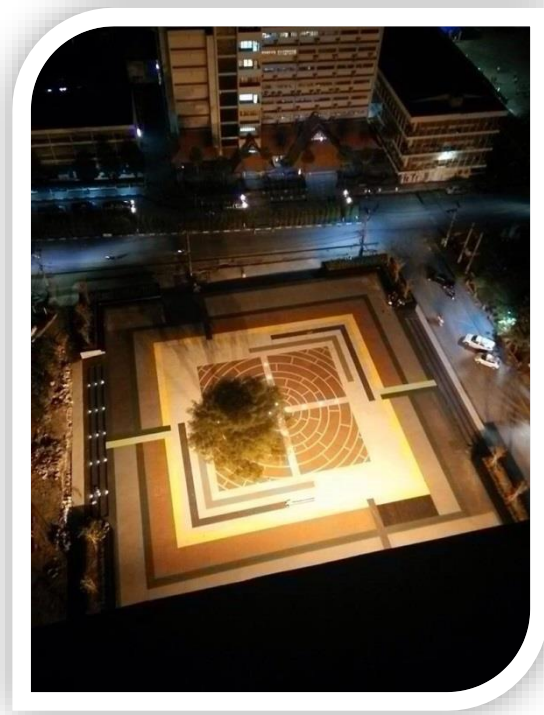


โครงการและปรับปรุงภูมิทัศน์ลานอเนกประสงค์  
ด้านหน้าอาคาร 90 ปี



โครงการปรับปรุงต่อเติมด้านหน้าอาคารห้องสมุด




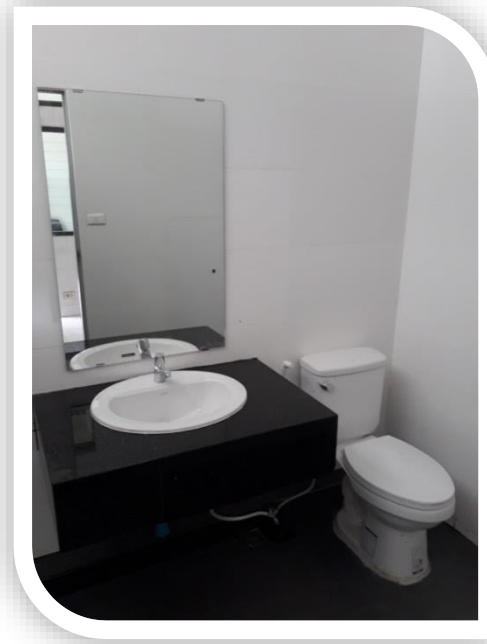

โครงการปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง อาคาร 2




โครงการก่อสร้างโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัย

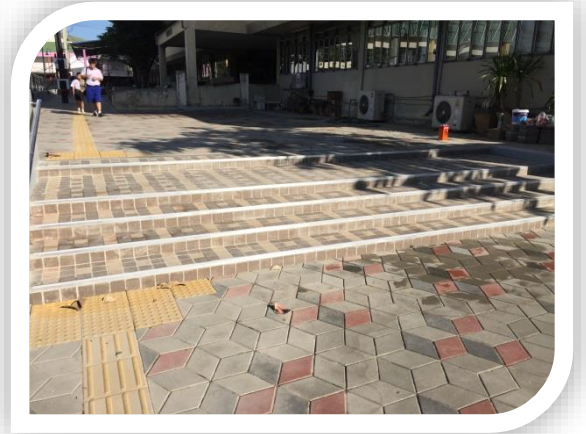

โครงการก่อสร้างถนนด้านหน้าอาคารการศึกษาพิเศษ  
เชื่อมต่ออาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่



โครงการขุดเจาะน้ำบาดาล  
พร้อมก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาล

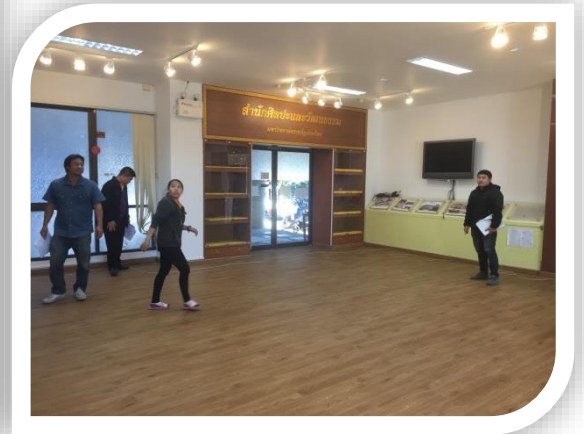

โครงการปรับปรุงอาคารเทพรัตนราชสุดา ชั้น 1 - 4



โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ  
และครุภัณฑ์ของนักศึกษา

# ศูนย์แมริม



โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



โครงการกลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์



โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารอำนวยการและบริหารกลาง  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่



โครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนบริเวณ  
หน้าอาคารหอประชุมเชื่อมต้อาคาร  
หอประชุมที่ปิงกรัศมีโชติ ศูนย์แมริม



# วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน



โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคาร  
เรียนรวมและปฏิบัติการ  
วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์



ภาพความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวม  
และปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
