

การดำเนินการประสานการปรับปรุง/ก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้างของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2562



ยุทธศาสตร์ที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

6. พัฒนาพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่ง
ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มี
คุณภาพและเป็นแหล่ง
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของท้องถิ่น



ประมวลภาพการ
ปรับปรุง/ ก่อสร้าง
สิ่งก่อสร้างของมหาวิทยาลัย

**รายงานการประสานดำเนินการปรับปรุง/ก่อสร้างสิ่งก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ 2562**

สถานที่	รายการปรับปรุง/ก่อสร้าง	วงเงินจัดจ้าง	วันเริ่ม/สิ้นสุดสัญญา	วันส่งมอบ/ตรวจรับงาน	หมายเหตุ
ศูนย์เวียงบัว	1. ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ จำนวน 1 หลัง	77,747,000	เริ่มวันที่ 16 ส.ค.2559 สิ้นสุดสัญญา 7 พ.ค.2561 ขยายเวลา 66 วัน สิ้นสุดสัญญา 12 ก.ค.2561	วันที่ 17 พฤษภาคม 2562	งบประมาณรายได้
	2. จ้างก่อสร้างห้องปฏิบัติการทางเครื่องบิน (Aircraft Cabin Mock-Up)	17,447,000.00	เริ่มวันที่ 27 ส.ค. 2561 สิ้นสุดสัญญา 23 พ.ค. 2562	วันที่ 28 มิถุนายน 2562	งบประมาณรายได้
	3. ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ จำนวน 1 หลัง (หลังที่ 2)	77,980,000	เริ่มวันที่ 27 ก.พ. 2563 สิ้นสุดสัญญา 16 ม.ค. 2565	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างงวดที่ 1	งบประมาณรายได้

สถานที่	รายการปรับปรุง/ก่อสร้าง	วงเงินจัดจ้าง	วันเริ่ม/สิ้นสุดสัญญา	วันส่งมอบ/ตรวจรับงาน	หมายเหตุ
ศูนย์แมริม	1. จ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์ พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 กลุ่มอาคาร	313,000,000	เริ่มวันที่ 14 มี.ค. 2559 สิ้นสุดสัญญา 30 ส.ค.2561 มี 29 งวด	วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563	งบประมาณแผ่นดิน (283,104,000) รายได้สมทบ (31,456,000)
	2. จ้างก่อสร้างถนนและภูมิทัศน์กลุ่มอาคารเรียนรวมและกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ศูนย์แมริม	88,500,000	เริ่มวันที่ 1 ส.ค. 2560 สิ้นสุดสัญญา 11 ก.ค.2561 มี 10 งวด	วันที่ 13 มีนาคม 2562	งบประมาณรายได้
	3. จ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารอเนกประสงค์และอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	120,323,000	เริ่มวันที่ 1 ส.ค. 2560 สิ้นสุดสัญญา 11 ก.ค.2561 มี 18 งวด	วันที่ 16 มิถุนายน 2562	งบประมาณรายได้
	4. จ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ขนาด 2 ชั้น 20 ยูนิต จำนวน 1 หลัง	13,170,000	เริ่มวันที่ 2 เม.ย.61 สิ้นสุดสัญญา 15 ก.พ.62	ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างงวดที่ 9	งบประมาณแผ่นดิน 2561
	5. จ้างก่อสร้างชุมชนบ้านประหยัดพลังงานโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์	11,862,000	เริ่มวันที่ 27 ก.ย.2561 สิ้นสุดสัญญา 21 ก.ย.2562	ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างงวดที่ 4	งบประมาณรายได้
6. จ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา พื้นที่ศูนย์แมริม หลังที่ 1	71,606,326.91	เริ่มวันที่ 4 ต.ค.2561 สิ้นสุดสัญญา 1 ม.ค.2562	ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างงวดที่ 15	งบประมาณรายได้	
7. จ้างปรับปรุงหอพักนักศึกษาหญิง 1 พื้นที่ศูนย์แมริม	1,767,500	เริ่มวันที่ 4 ต.ค.2561 สิ้นสุดสัญญา 1 ม.ค.2562	วันที่ 1 เมษายน 2562	งบประมาณรายได้	

สถานที่	รายการปรับปรุง/ก่อสร้าง	วงเงินจัดจ้าง	วันเริ่ม/สิ้นสุดสัญญา	วันส่งมอบ/ตรวจรับงาน	หมายเหตุ
ศูนย์แมริม (ต่อ)	8. จ้างปรับปรุงหอพักนักศึกษาหญิง 2 พื้นที่ศูนย์แมริม	1,767,000	เริ่มวันที่ 4 ต.ค.2561 สิ้นสุดสัญญา 1 ม.ค.2562	วันที่ 1 เมษายน 2562	งบประมาณรายได้
	9. จ้างปรับปรุงหอพักนักศึกษาชาย 1 พื้นที่ศูนย์แมริม	2,105,900	เริ่มวันที่ 4 ต.ค.2561 สิ้นสุดสัญญา 1 ม.ค.2562	วันที่ 1 เมษายน 2562	งบประมาณรายได้
	10. จ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา พื้นที่ศูนย์แมริม หลังที่ 2	75,363,977.90	เริ่มวันที่ 27 ก.พ.2562 สิ้นสุดสัญญา 6 พ.ค.2564	ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างงวดที่ 12	งบประมาณรายได้
	11. จ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 1	141,600,000	เริ่มวันที่ 15 ก.ค.2562 สิ้นสุดสัญญา 31 ต.ค.2564	ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างงวดที่ 4	งบประมาณรายได้
	12. จ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 2	140,900,000	เริ่มวันที่ 8 ก.ค.2562 สิ้นสุดสัญญา 24 ต.ค.2564	ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างงวดที่ 9	งบประมาณรายได้
	13. จ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารสนามกีฬา จำนวน 1 รายการ	515,000,000	เริ่มวันที่ 3 ต.ค.2562 สิ้นสุดสัญญา 15 พ.ย.2565	ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างงวดที่ 1	งบประมาณรายได้
	14. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก พร้อมรางระบายน้ำและไฟฟ้าส่องสว่าง ระยะทาง 1 กิโลเมตร	22,950,000	เริ่มวันที่ - สิ้นสุดสัญญา -		งบประมาณรายได้
	15. จ้างออกแบบอาคารวิศวกรรมและก่อสร้าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,150,000	เริ่มวันที่ 22 ต.ค.2561 สิ้นสุดสัญญา 19 ม.ค.2562	วันที่ 31 มกราคม 2562	งบประมาณรายได้
	16. ชุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยสะแล่งบริเวณสวนสมุนไพร ศูนย์แมริม	1,490,000	เริ่มวันที่ 2 พ.ค.2562 สิ้นสุดสัญญา 30 มิ.ย.2562	วันที่ 22 สิงหาคม 2562	งบประมาณรายได้

สถานที่	รายการปรับปรุง/ก่อสร้าง	วงเงินจัดจ้าง	วันเริ่ม/สิ้นสุดสัญญา	วันส่งมอบ/ตรวจรับงาน	หมายเหตุ
ศูนย์แมริม (ต่อ)	17. ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ชุมชน สีเขียว วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	2,300,000	เริ่มวันที่ 26 เม.ย.2562 สิ้นสุดสัญญา 18 ก.ย.2562	วันที่ 2 ตุลาคม 2562	งบประมาณแผ่นดิน
	18. จ้างออกแบบก่อสร้างกลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์	12,300,000	เริ่มวันที่ 16 ก.ค.2561 สิ้นสุดสัญญา 12 มี.ค.2562	วันที่ 25 มีนาคม 2562	งบประมาณรายได้
	19. ปรับปรุงห้องประชุม ห้องรับรอง ห้องสำนักงานเลขานุการ ห้องทำงานผู้บริหาร พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคารอำนวยการ และบริหารกลาง	20,686,076.75	เริ่มวันที่ 13 ก.ค.2562 สิ้นสุดสัญญา 18 ธ.ค.2562	วันที่ 6 มกราคม 2563	งบประมาณรายได้

สถานที่	รายการปรับปรุง/ก่อสร้าง	วงเงินจัดจ้าง	วันเริ่ม/สิ้นสุดสัญญา	วันส่งมอบ/ตรวจรับงาน	หมายเหตุ
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	1. จ้างก่อสร้างระบบสูบน้ำผิวดินจากแหล่งน้ำประปาผิวดิน วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	3,888,888.00	เริ่มวันที่ 20 ส.ค.2561 สิ้นสุดสัญญา 16 ม.ค. 2562	วันที่ 17 ม.ค. 2562	งบประมาณรายได้
	2. จ้างออกแบบศูนย์ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นตาม แนวพระราชดำริ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	3,412,500	เริ่มวันที่ 21 ก.พ.2562 สิ้นสุดสัญญา 20 มิ.ย. 2562	วันที่ 8 พ.ค.2562	งบประมาณรายได้
	3. ก่อสร้างหอพักนักศึกษา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	57,860,000	เริ่มวันที่ 9 ส.ค.2562 สิ้นสุดสัญญา 9 พ.ค.2564	ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างงวดที่ 3	งบประมาณรายได้
	4. ก่อสร้างถนนทางเข้าหลัก วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	20,930,000	เริ่มวันที่ 5 ก.ย.2562 สิ้นสุดสัญญา 22 พ.ค. 2563	ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	งบประมาณรายได้

ที่มา : กองการพัสดุ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ศูนย์เวียงบัว





หอพักนักศึกษานานาชาติ จำนวน 1 หลัง



ห้องปฏิบัติการทางการบิน

ศูนย์แมริม

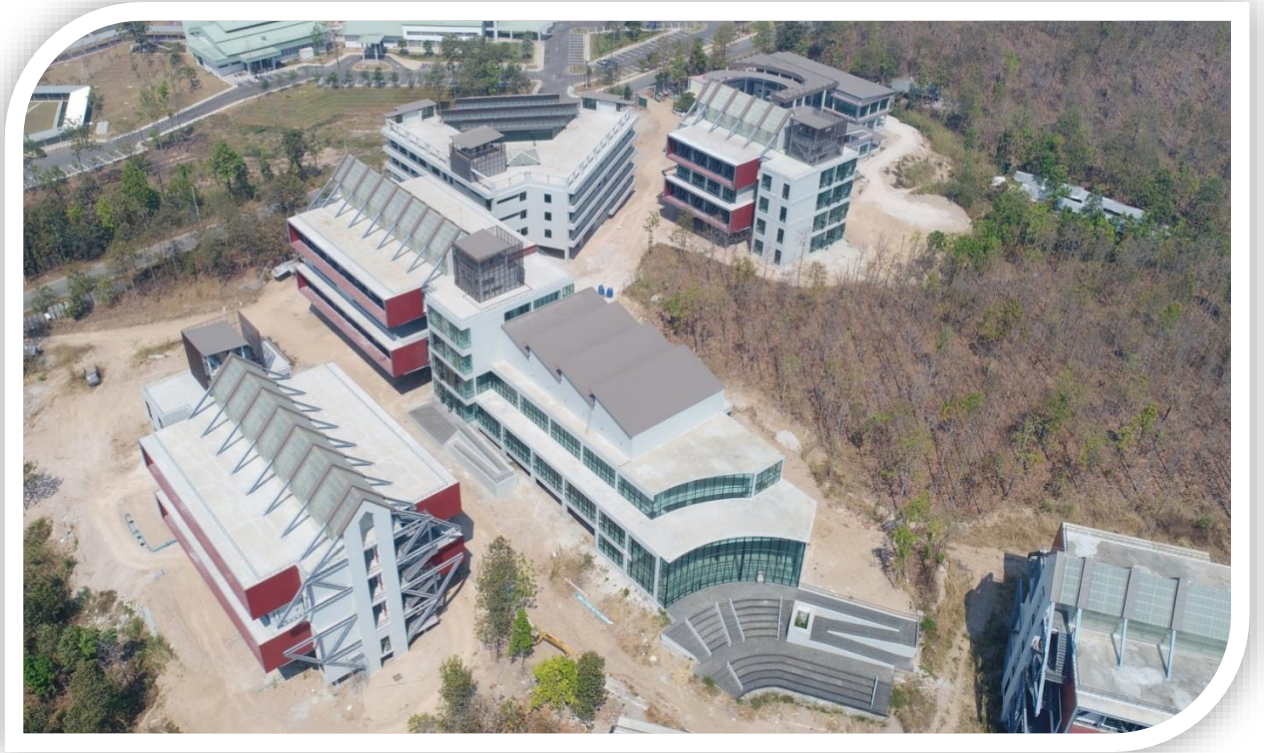

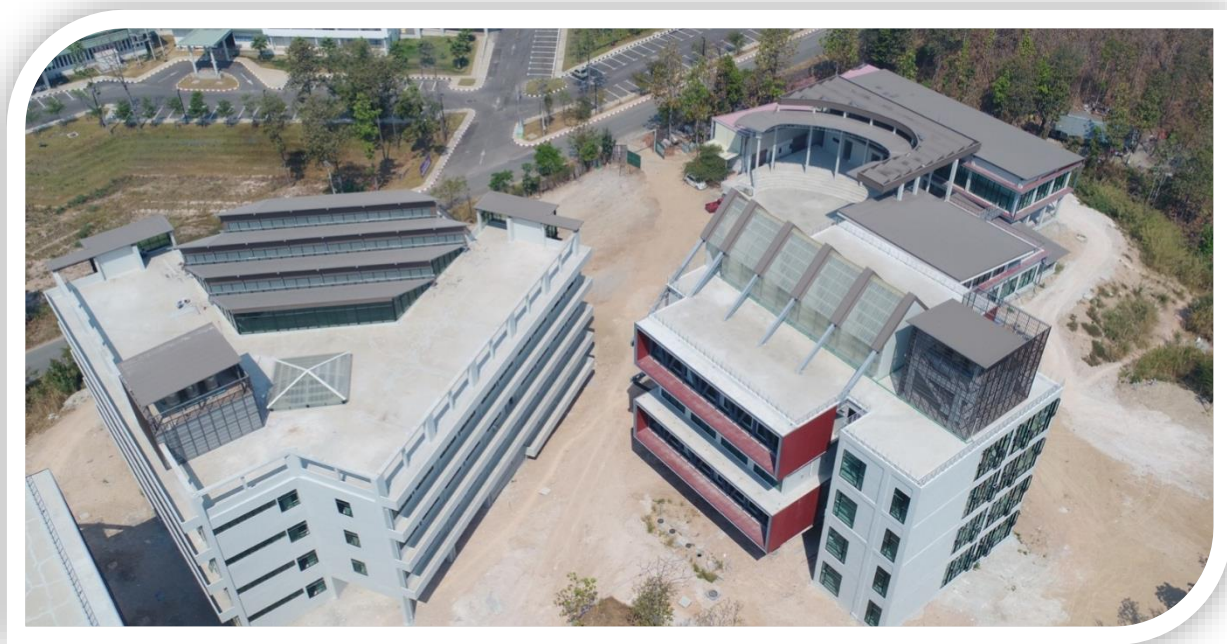




โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์



โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารสนามกีฬากลาง






โครงการปรับปรุงห้องประชุม ห้องรับรอง
ห้องสำนักงานเลขานุการ ห้องทำงาน
ผู้บริหาร พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
อำนวยการและบริหารกลาง

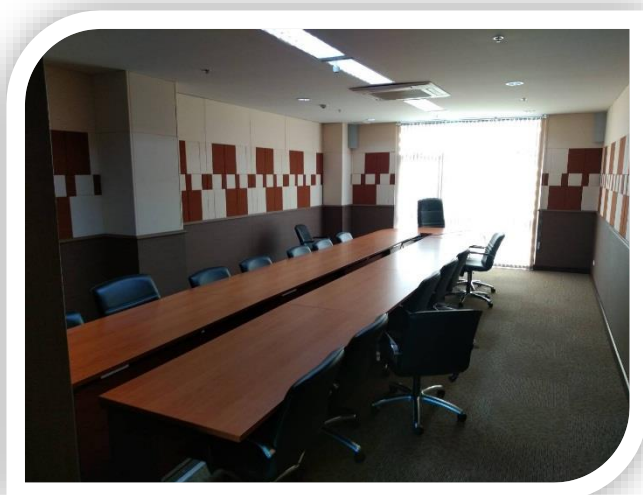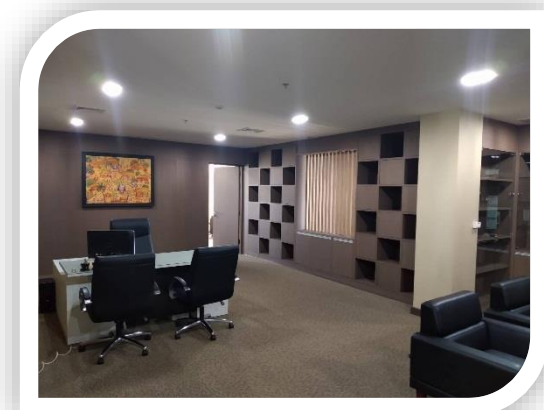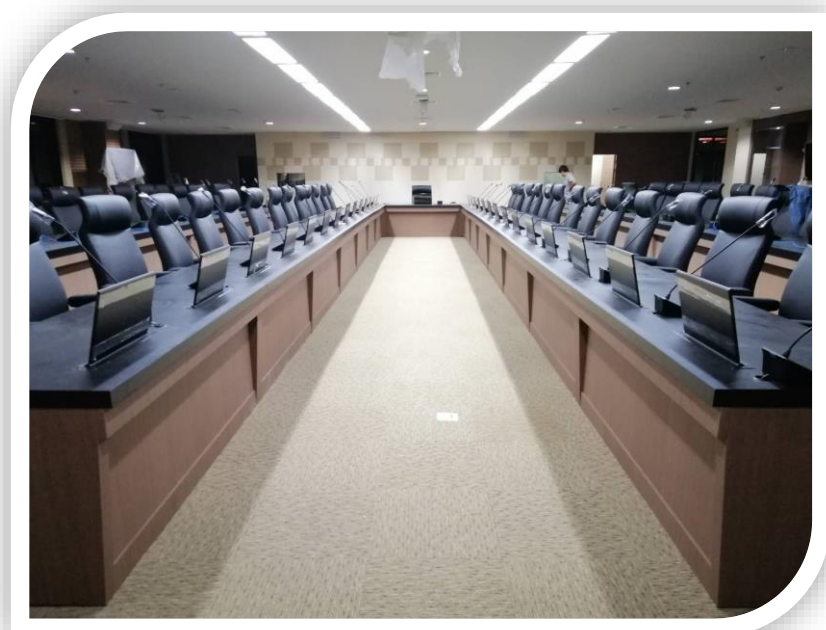


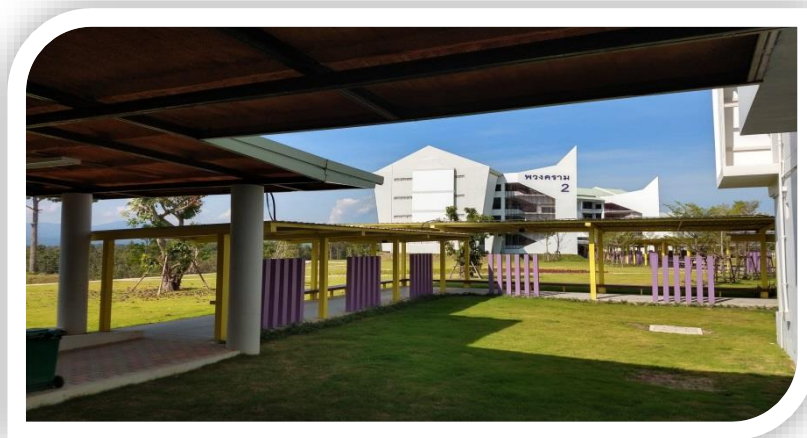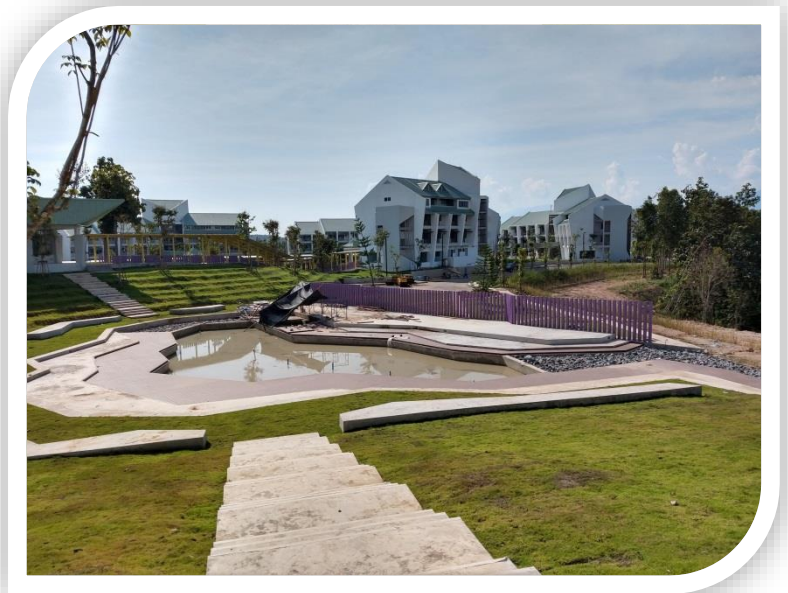

โครงการถนนและภูมิทัศน์กลุ่มอาคารเรียนรวมและกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา คณะครุศาสตร์
ศูนย์แมริม

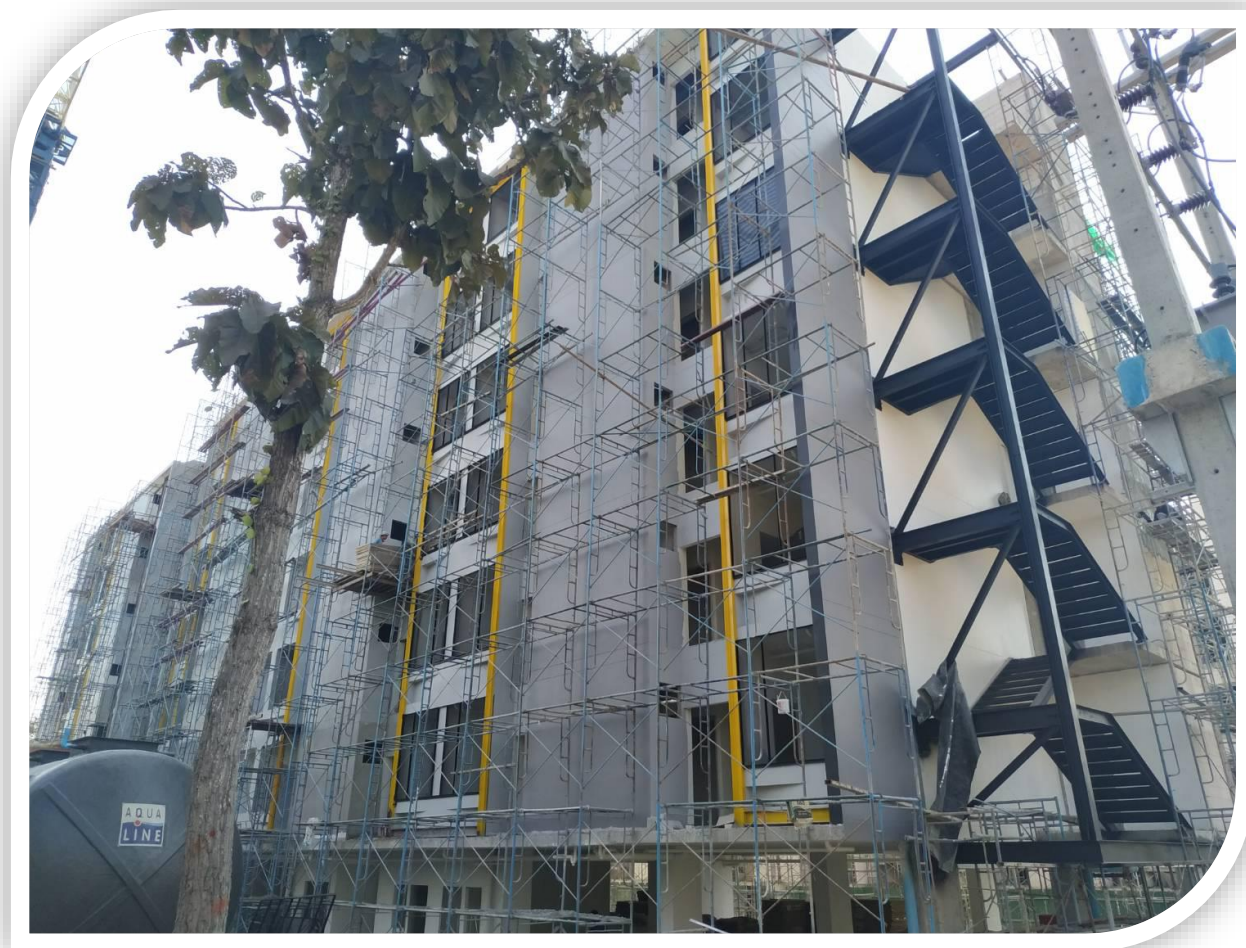

โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ศูนย์แมริม หลังที่ 1

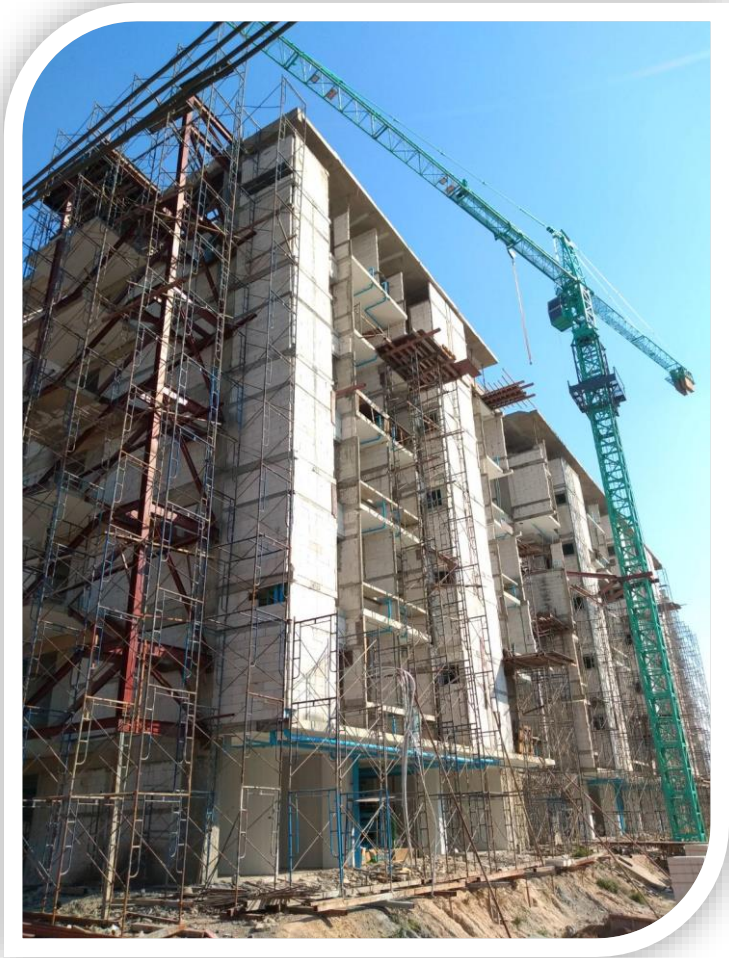

โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ศูนย์แมริม หลังที่ 2



โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา ศูนย์แมริม

กลุ่มที่ 1



โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา ศูนย์แมริม
กลุ่มที่ 2



โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาบุคลากร จำนวน 20 ห้อง
หลังที่ 2



โครงการก่อสร้างบ้านประหยัดพลังงาน จำนวน 10 หลัง

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน



โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน



จ้างก่อสร้างถนนทางเข้าหลัก วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
