

การดำเนินการประสานการปรับปรุง/ก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้างของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2564



ยุทธศาสตร์ที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

6. พัฒนาพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่ง
ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มี
คุณภาพและเป็นแหล่ง
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของท้องถิ่น



ประมวลภาพการ
ปรับปรุง/ ก่อสร้าง
สิ่งก่อสร้างของมหาวิทยาลัย

**รายงานการประสานดำเนินการปรับปรุง/ก่อสร้างสิ่งก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ 2564**

สถานที่	รายการปรับปรุง/ก่อสร้าง	วงเงินจัด จ้าง	วันเริ่ม/สิ้นสุดสัญญา	วันส่งมอบ/ตรวจรับ งาน	หมายเหตุ
ศูนย์เวียงบัว	1. ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ จำนวน 1 หลัง (หลังที่ 2)	77,980,000	เริ่มวันที่ 27 ก.พ. 2563 สิ้นสุดสัญญา 16 ม.ค. 2565	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างงวดที่ 7 วันที่ 27 ก.ค. 2564	งบประมาณรายได้
	2. ปรับปรุงโรงเก็บของอาคารศิลปกรรม	1,050,000	เริ่มวันที่ 5 มี.ค.2564 สิ้นสุดสัญญา 1 ส.ค. 2564	30 กรกฎาคม 2564	งบประมาณแผ่นดิน

สถานที่	รายการปรับปรุง/ก่อสร้าง	วงเงินจัดจ้าง	วันเริ่ม/สิ้นสุดสัญญา	วันส่งมอบ/ตรวจรับ งาน	หมายเหตุ
ศูนย์แม่ธา	1. ก่อสร้างอาคารและโรงเรือนพัฒนาสายพันธุ์และปลูกกัญชา	13,170,000	เริ่มวันที่ 2 เม.ย.2561 สิ้นสุดสัญญา 15 ก.พ.2562	ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างงวดที่ 3	งบประมาณรายได้

สถานที่	รายการปรับปรุง/ก่อสร้าง	วงเงินจัดจ้าง	วันเริ่ม/สิ้นสุดสัญญา	วันส่งมอบ/ตรวจรับ งาน	หมายเหตุ
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	1. ก่อสร้างหอพักนักศึกษา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	57,860,000	เริ่มวันที่ 9 ส.ค.2562 สิ้นสุดสัญญา 9 พ.ค.2564	ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างงวดที่ 11	งบประมาณรายได้
	2. ก่อสร้างถนนทางเข้าหลัก วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	20,930,000	เริ่มวันที่ 5 ก.ย.2562 สิ้นสุดสัญญา 22 พ.ค.2563	24 พฤศจิกายน 2563	งบประมาณรายได้
	3. จ้างปรับปรุงอาคาร 3 ชั้น	3,914,000	เริ่มวันที่ 30 มี.ค.2564 สิ้นสุดสัญญา 25 ก.ย.2564	ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างงวดที่ 3	งบประมาณแผ่นดิน



สถานที่	รายการปรับปรุง/ก่อสร้าง	วงเงินจัดจ้าง	วันเริ่ม/สิ้นสุดสัญญา	วันส่งมอบ/ตรวจรับงาน	หมายเหตุ
	11. จ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติกลาง)	311,499,900	เริ่มวันที่ 3 ก.ย. 2563 สิ้นสุดสัญญา 19 ก.พ. 2566	ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างงวดที่ 2	งบประมาณรายได้
	12. จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และสาธารณูปโภคโดยรอบกลุ่มอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	24,000,000	เริ่มวันที่ 6 ธ.ค. 2562 สิ้นสุดสัญญา 29 พ.ย. 2563	ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างงวดที่ 3	งบประมาณรายได้
	13. จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตและรางระบายน้ำระยะทาง 1.443 กิโลเมตร	10,200,000	เริ่มวันที่ 15 ก.พ. 2564 สิ้นสุดสัญญา 25 พ.ย. 2564	ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างงวดที่ 3	งบประมาณ แผ่นดิน
	14. จ้างก่อสร้างอาคารวิศวกรรมและก่อสร้าง	30,500,000	เริ่มวันที่ 1 เม.ย.2564 สิ้นสุดสัญญา 26 ธ.ค.2564	ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างงวดที่ 2	งบประมาณ แผ่นดิน

ที่มา : กองการพัสดุ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ศูนย์เวียงบัว




โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ
(พื้นที่ชายทุ่ง) จำนวน 1 หลัง

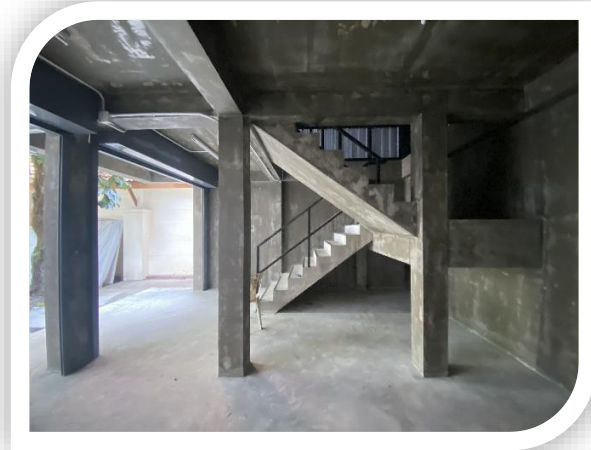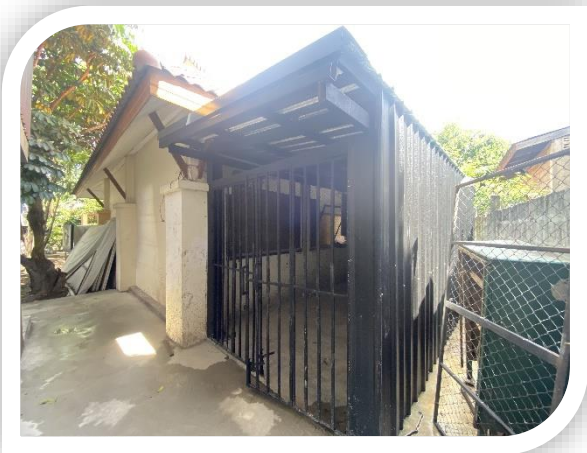

โครงการจ้างปรับปรุงโรงเก็บของอาคารศิลปกรรม

ศูนย์แม่ริม

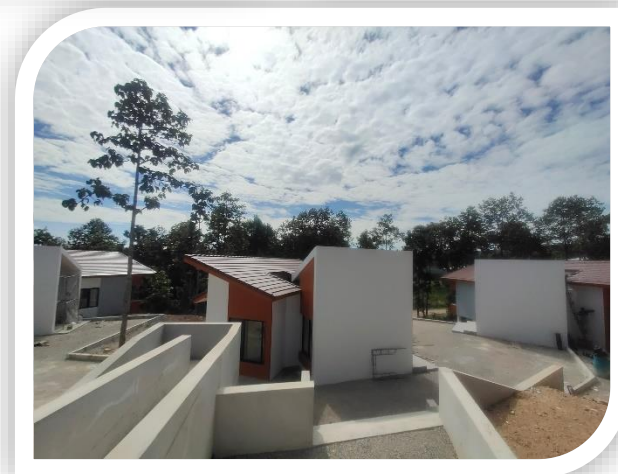


โครงการก่อสร้างชุมชนบ้านประหยัดพลังงานโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
พร้อมระบบสาธารณสุขปลอดภัยและภูมิทัศน์



โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา พื้นที่ศูนย์แมริม หลังที่ 2





โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 1

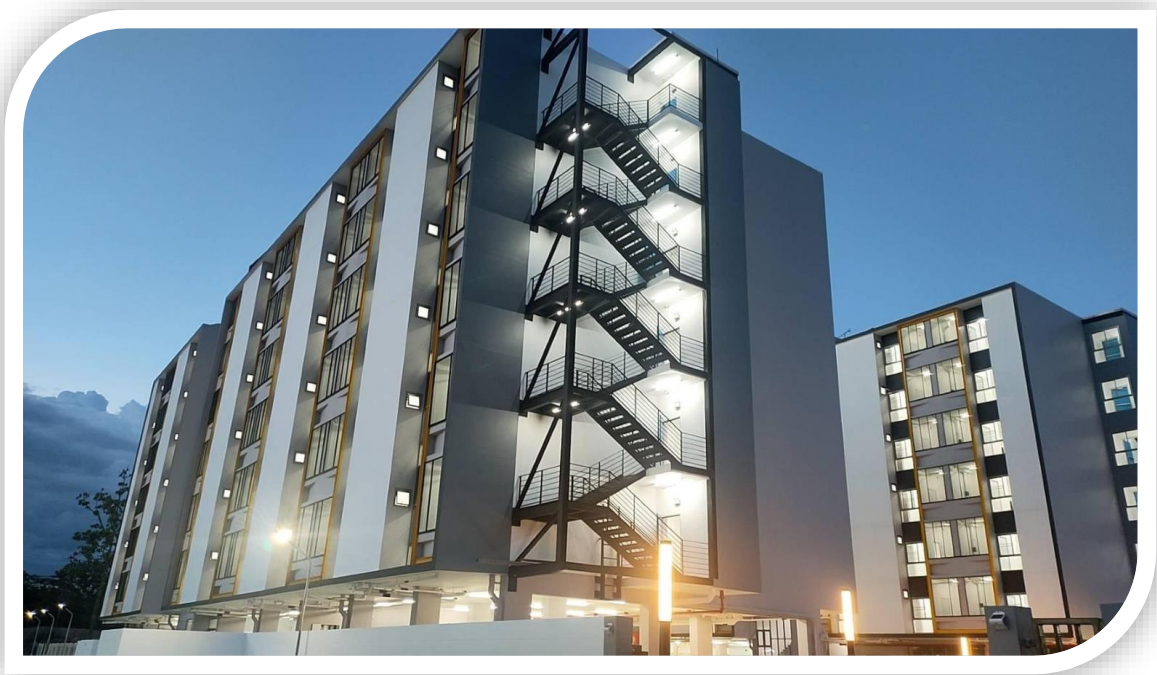

โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 2



โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารสนามกีฬากลาง

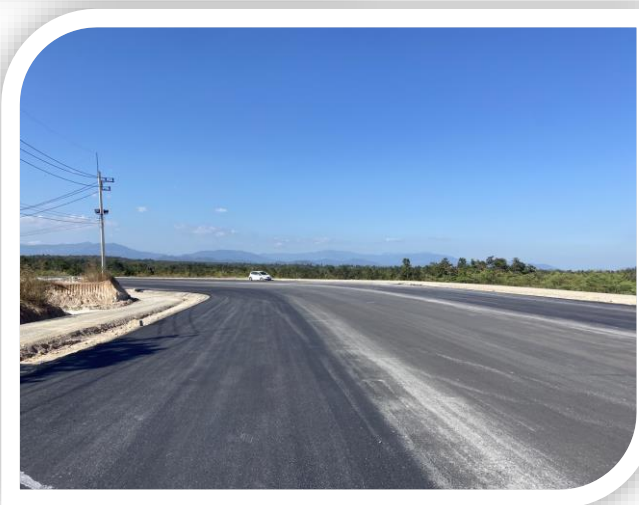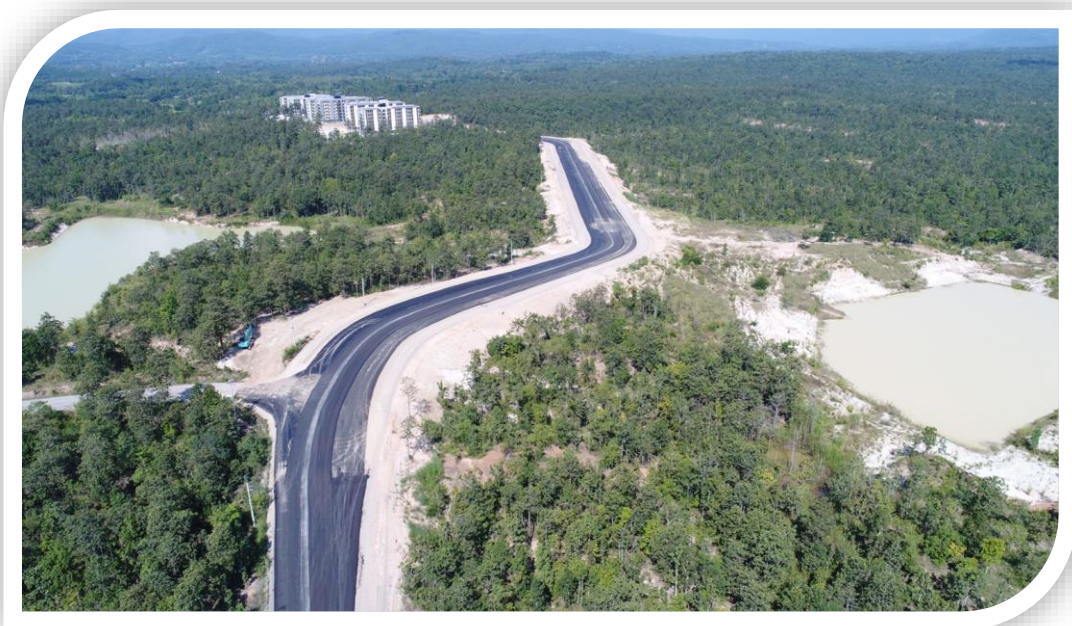

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก พร้อมรางระบายน้ำ
และไฟฟ้าส่องสว่าง ระยะทาง 1 กิโลเมตร



โครงการก่อสร้างอาคารหอพักสำหรับบุคลากร ขนาด 20 หน่วย



โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 3



โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(อาคารเรียนรวมและปฏิบัติกลาง)



โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสาธารณูปโภคโดยรอบกลุ่มอาคารเรียนรวม
และปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



โครงการจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตและวางระบายน้ำ
ระยะทาง 1.443 กิโลเมตร



โครงการจ้างก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุครุภัณฑ์ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา



โครงการจ้างก่อสร้างอาคารโรงซ่อมบำรุงวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัด
กิจกรรมของนักศึกษาและมหาวิทยาลัย




โครงการจ้างก่อสร้างอาคารวิศวกรรมและก่อสร้าง

ศูนย์แม่สา




โครงการก่อสร้างอาคารและโรงเรือนพัฒนาสายพันธุ์และปลูกกล้วยา

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

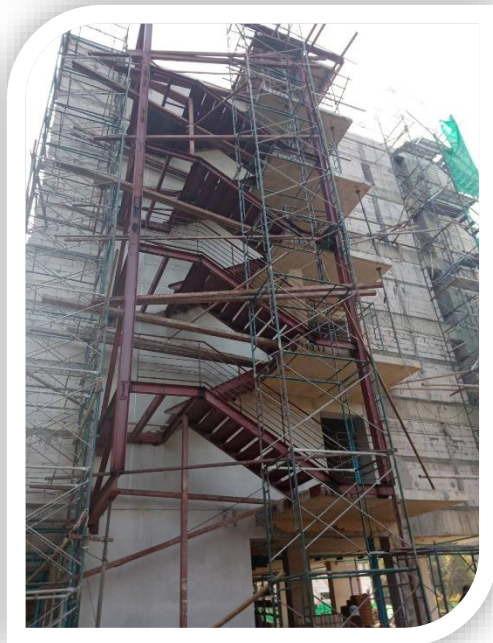

โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

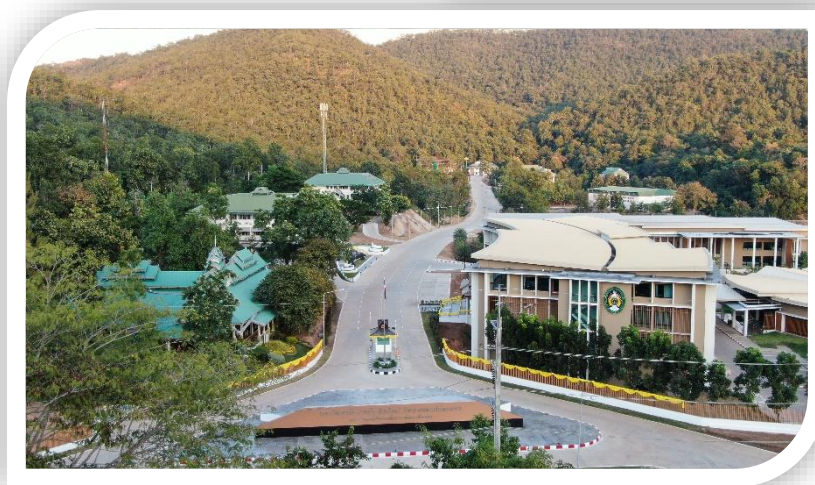

ก่อสร้างถนนทางเข้าหลัก วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
