

การดำเนินการประสานการปรับปรุง/ก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้างของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2559



ยุทธศาสตร์ที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

6. พัฒนาพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่ง
ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มี
คุณภาพและเป็นแหล่ง
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของท้องถิ่น



ประมวลภาพการ
ปรับปรุง/ ก่อสร้าง
สิ่งก่อสร้างของมหาวิทยาลัย

**รายงานการประสานดำเนินการปรับปรุง/ก่อสร้างสิ่งก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ 2559**

| สถานที่ | รายการปรับปรุง/ก่อสร้าง | วงเงินจัดจ้าง | วันเริ่ม/สิ้นสุดสัญญา | วันส่งมอบ/ตรวจรับงาน | หมายเหตุ |
|---------------|--|---------------|---|--|--|
| ศูนย์เวียงบัว | 1. โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาครูและทรัพยากรมนุษย์ | 350,000,000 | เริ่มวันที่ 27 พ.ย. 2556 สิ้นสุดสัญญา 19เม.ย.59 จำนวน 24 งวดงาน | ตรวจรับเมื่อวันที่ 3 ก.ค. 59 | งบประมาณ แผ่นดิน (315,000,000) รายได้สมทบ (35,000,000) |
| | 2. โครงการก่อสร้างอาคารการศึกษาปฐมวัยพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ | 25,000,000 | เริ่มวันที่ 2 ก.พ. 2558 สิ้นสุดสัญญา 26เม.ย.59 จำนวน 15 งวด | ตรวจรับเมื่อวันที่ 2 ส.ค.59 | งบประมาณรายได้ (25,000,000) |
| | 3. โครงการก่อสร้างโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัย | 30,000,000 | เริ่มวันที่ 23 พ.ย. 2558 สิ้นสุดสัญญา 17 ก.ย.59 จำนวน 9 งวด | อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างงวดที่ 4 - 9 | งบประมาณรายได้ |
| | 4. ปรับปรุงเรือนอนุสารสุนทร | 1,421,879.84 | 5 ต.ค.58 สิ้นสุดสัญญา 2 มี.ค. 59 | ตรวจรับเมื่อวันที่ 2 ส.ค. 59 | งบประมาณรายได้ |
| | | | | | |

| สถานที่ | รายการปรับปรุง/ก่อสร้าง | วงเงินจัดจ้าง | วันเริ่ม/สิ้นสุดสัญญา | วันส่งมอบ/ตรวจรับงาน | หมายเหตุ |
|------------|--|---------------|--|----------------------------------|----------------|
| ศูนย์แม่สา | 1. โครงการก่อสร้างโรงอาหารต่อจากที่ก่อสร้างไว้แล้ว | 5,000,000 | เริ่มวันที่ 22มิ.ย. 58 สิ้นสุดสัญญา 19ต.ค. 58 | ตรวจรับเมื่อวันที่ 25 พ.ค. 58 | งบประมาณรายได้ |

| สถานที่ | รายการปรับปรุง/ก่อสร้าง | วงเงินจัดจ้าง | วันเริ่ม/สิ้นสุดสัญญา | วันส่งมอบ/ตรวจรับงาน | หมายเหตุ |
|------------|--|---------------|--|----------------------------------|---|
| ศูนย์แมริม | 1. โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | 461,000,000 | เริ่มวันที่ 3ส.ค. 58 สิ้นสุดสัญญา 14พ.ย. 61 | ระหว่างดำเนินการ | งบประมาณแผ่นดิน (414,800,000) รายได้สมทบ (46,200,000) |
| | 2. โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ | 68,800,000 | เริ่มวันที่ 19 พ.ย. 2558 สิ้นสุดสัญญา 11 ก.พ.59 จำนวน 15 งวด | ตรวจรับเมื่อวันที่ 10 ก.พ. 59 | งบประมาณรายได้ |
| | 3. โครงการก่อสร้างโรงฝึกงานอุตสาหกรรมศิลป์ | 69,870,000 | เริ่มวันที่ 9 ก.พ.2558 สิ้นสุดสัญญา 22 มิ.ย.59 จำนวนงวดงาน 12 งวด | ตรวจรับเมื่อวันที่ 6 ก.ค. 59 | งบประมาณแผ่นดิน (69,870,000) รายได้สมทบ (6,987,000) |
| | 4. โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมต่อจากที่ก่อสร้างไว้แล้ว | 71,600,000 | เริ่มวันที่ 18 ม.ค.2559 สิ้นสุดสัญญา 11 ม.ค.60 ปรับลดระยะเวลาการ ก่อสร้าง 70 ทำให้สัญญา สิ้นสุด 2 พ.ย.59 จำนวนงวดงาน 12 งวด | ตรวจรับเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 59 | งบประมาณแผ่นดิน (47,051,899.92) รายได้สมทบ (71,600,099.92) |


| | | | | |
|---|------------|---|---------------------------------|--|
| 5. โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาต่อจากที่ก่อสร้างไว้แล้ว | 58,460,000 | เริ่มวันที่ 18 ม.ค.2559 สิ้นสุดสัญญา 11 ม.ค.60 ปรับลดระยะเวลาการ ก่อสร้าง 60 ทำให้สัญญา สิ้นสุด 12 พ.ย.59 จำนวนงวดงาน 12 งวด | ตรวจรับเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 59 | งบประมาณแผ่นดิน (30,843,344.16) รายได้สมทบ (27,616,700) |
| 6. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถพร้อมอาคารประกอบ | 35,000,000 | เริ่มวันที่ 7เม.ย.2558สิ้นสุด สัญญา 31 มี.ค.2559 จำนวนงวดงาน 12 งวด | ตรวจรับเมื่อวันที่ 2 ก.ย. 59 | งบประมาณรายได้ |
| 7. โครงการก่อสร้างลานพระพิฆเนศวร | 15,000,000 | เริ่มวันที่ 1 ก.ย.2557 สิ้นสุดสัญญา28เม.ย.2558 | ตรวจรับเมื่อวันที่ 4 พ.ย. 59 | งบประมาณรายได้ |
| 8. โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำจากคลองชลประทาน | 5,340,000 | เริ่มวันที่ 22 ธ.ค.2557 สิ้นสุดสัญญา 19 ก.ค.58 | ระหว่างดำเนินการงวดที่ 4 | งบประมาณรายได้ |

| สถานที่ | รายการปรับปรุง/ก่อสร้าง | วงเงินจัดจ้าง | วันเริ่ม/สิ้นสุดสัญญา | วันส่งมอบ/ตรวจรับงาน | หมายเหตุ |
|--------------------|---|---------------|---|--------------------------------------|--|
| | 9. จ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 กลุ่มอาคาร | 313,000,000 | | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 7 | งบประมาณแผ่นดิน (283,104,000) รายได้สมทบ (31,456,000) |
| | 10. จ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารอำนวยการและบริหารกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | 245,626,000 | | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 4 | งบประมาณรายได้ |
| | 11. ปรับปรุงลานจอดรถและภูมิทัศน์บริเวณข้างอาคารหอประชุมที่ปิงกรัคมิโชติ | 8,280,000 | | ตรวจรับเมื่อวันที่ 21 ต.ค.59 | งบประมาณแผ่นดิน |
| | 12. ปรับปรุงและก่อสร้างถนนบริเวณหน้าอาคารหอประชุมเชื่อมต่ออาคารหอประชุมที่ปิงกรัคมิโชติ ศูนย์แม่ริม | 3,450,000 | | ตรวจรับเมื่อวันที่ 14 ก.ย.59 | งบประมาณแผ่นดิน |
| | | | | | |
| วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | 1. โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำ ศูนย์แม่ฮ่องสอน | 6,893,000 | เริ่มวันที่ 5 ม.ค. 58 สิ้นสุดสัญญา 2 ส.ค.58 | ตรวจรับเมื่อวันที่ 17 ก.ย.59 | งบประมาณรายได้ |
| | 2. โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ศูนย์แม่ฮ่องสอน | 1,655,108 | เริ่มวันที่ 24 ส.ค.58 สิ้นสุดสัญญา 20 ม.ค.58 | ตรวจรับเมื่อวันที่ 11 เม.ย.59 | งบประมาณรายได้ |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|-------------|--|------------------------------|--|
| | 3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและทางเดินเท้า | 560,000 | เริ่มวันที่ 21 ม.ค.2558 สิ้นสุดสัญญา 20 เม.ย.58 | ตรวจรับเมื่อวันที่ 13 ก.ค.59 | งบประมาณรายได้ |
| | 4. จ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการด้าน วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | 245,626,000 | เริ่มวันที่ 1 เม.ย.59 สิ้นสุดสัญญา 21 มี.ค.61 | ระหว่างดำเนินการงวดที่ 6 | งบประมาณแผ่นดิน (221,175,000) รายได้สมทบ (24,575,000) |
| | | | | | |
| | | | | | |

ที่มา : งานพัสดุ กองคลัง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

ศูนย์เวียงบัว

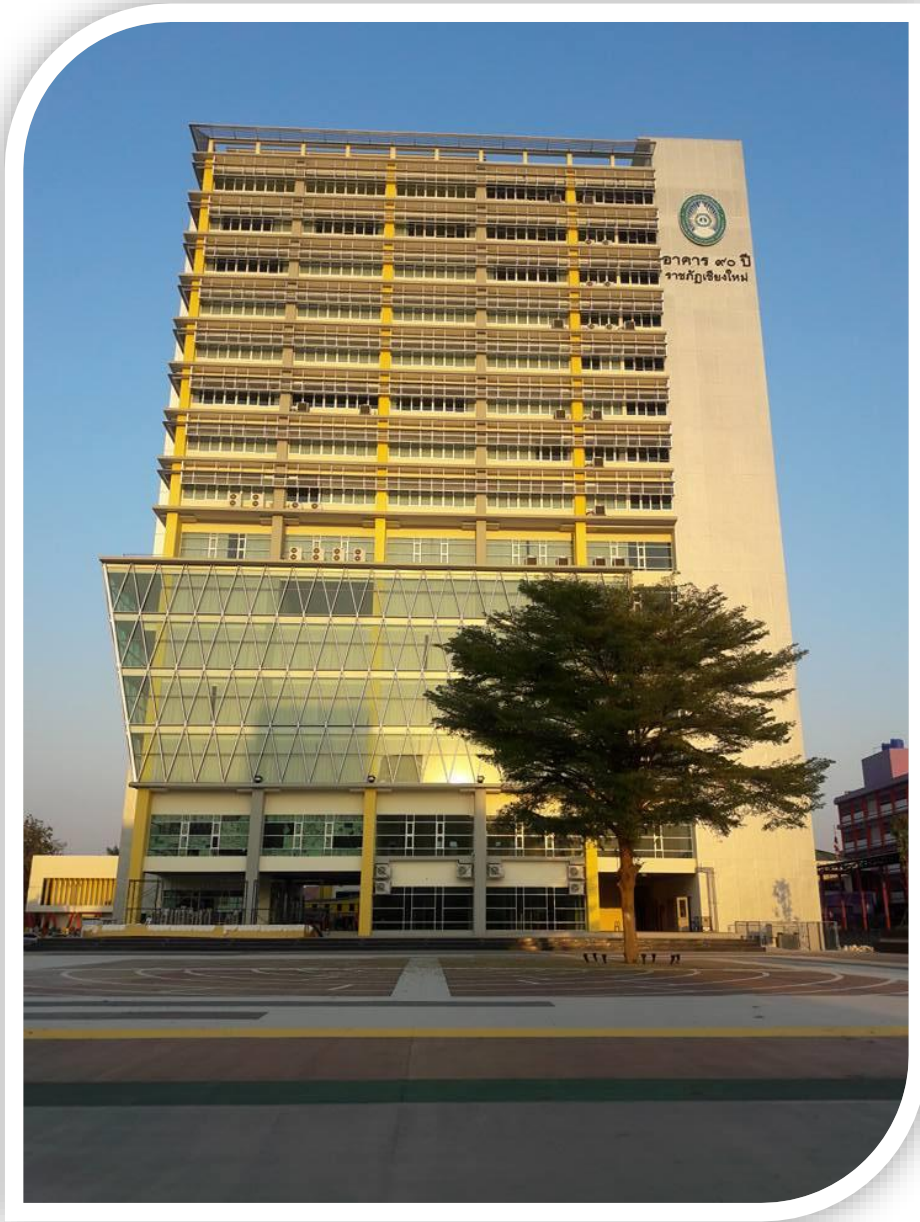

โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาครูและทรัพยากรมนุษย์



โครงการก่อสร้างอาคารปฐมวัยพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ



โครงการก่อสร้างโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัย



โครงการก่อสร้างปรับปรุงเรือนอนุสารสุนทร

ศูนย์แม่สา



โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์แม่สา

ศูนย์แม่ริม



โครงการก่อสร้างลานพระพิฆเนศวร



โครงการก่อสร้างโรงจอดรถพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ



โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์



โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวม



โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา



โครงการก่อสร้างโรงฝึกงานอุตสาหกรรม



โครงการกลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์



โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารอำนวยการและบริหารกลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่



โครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนบริเวณหน้าอาคารหอประชุม
เชื่อมต่ออาคารหอประชุมที่ปิงกรัศมีโชติ ศูนย์แม่ริม




โครงการปรับปรุงลานจอดรถและภูมิทัศน์บริเวณข้างอาคาร
หอประชุมที่ปังกรรัศมีโชติ

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน




โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียน
รวมและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
และสังคมศาสตร์

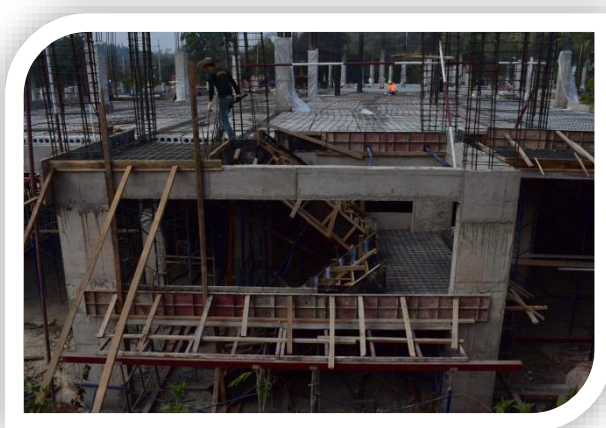

ภาพความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวม
และปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำ
ศูนย์แม่ฮ่องสอน

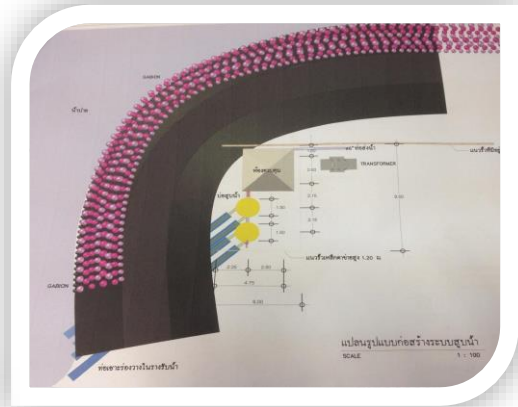

โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำ
